


SWEDD NIGER

Projet régional d'autonomisation des femmes du Sahel

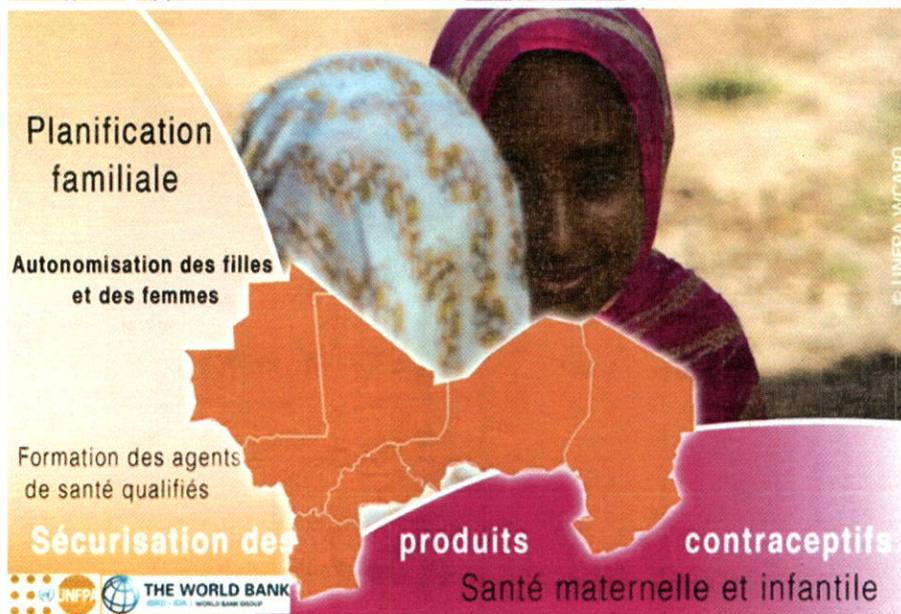

Planification familiale

Autonomisation des filles et des femmes

Formation des agents de santé qualifiés

Sécurisation des produits contraceptifs

Santé maternelle et infantile

© UNFPA/WCARD

UNFPA THE WORLD BANK

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017

Projet Régional pour l'Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Plan de Travail Budget Annuel (PTBA) 2017 du Niger

N°	ACTIVITE	DESCRIPTION	Indicateur	PARTENAIRE	BUDGET	BUDGET	RESPONSABLE	ANNEE 2017											
			Intitulé		(FCFA)	(USD)		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Composante 1: Améliorer la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des femmes et des adolescentes																			
Sous-composante 1.1 : Lancer une campagne de communication régionale																			
1	Organisation du Lancement du Projet national SWEDD	Il s'agit d'organiser un atelier national du lancement du Projet SWEDD en vue de faire connaître davantage le Projet au sein de la population nigérienne en général et des acteurs clés de mise en oeuvre en particulier.	Lancement organisé	UGPSWEDD, UNFPA, BM	6 000 000	12 000	MPO	X											
2	Finalisation de la Stratégie nationale de Communication pour un Changement Social et de Comportement (CCSC)	Adoption de la Stratégie CCSC par le Gouvernement	Un document de Stratégie adopté	Ministères Sectoriels, UNFPA, BM, OOAS, ONG	50 000 000	100 000	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Mise en œuvre du Plan d'action budgétisé de la Stratégie nationale de Communication pour un Changement Social et de Comportement (CCSC)	Il s'agit de mettre en œuvre les activités programmées dans le Plan d'action budgétisé de la Stratégie nationale CCSC	Activités réalisées	Ministères Sectoriels, UNFPA, BM, OOAS, ONG	1 138 500 000	2 277 000	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Conception/Production des supports de Communication et Réalisation de campagne de sensibilisation pour un Changement Social et de Comportement (CCSC) sur le Dividende Démographique à travers la contractualisation avec 5 structures nationales (ORTN, SongES, Animas Sutura, Inter Média) déjà identifiées dans le	Il s'agit de signer des contrats de prestation de service avec 5 structures nationales identifiées dans le cadre de la mise en œuvre du SWEDD, pour concevoir/produire des supports de communication et mener des campagnes de sensibilisation sur le DD	Nbre de contrats signés	ORTN, ANIMAS, UNFPA, BM, SONGES, Intermédia, IFTIC	50 000 000	100 000	MPO (DSIC)		X										

16	Campagne de sensibilisation des communautés à la base en faveur de la SCOFI	<p>Organisation des campagnes de sensibilisation de proximité qui mobiliseront les communautés à la base (APE, COGES, Elus locaux, associations religieuses, chefferie traditionnelle, leaders d'opinion, enseignants, administration scolaire, élèves, associations féminines) à travers des réunions et causeries – débats dans les établissements ciblés. La sensibilisation se fera autour des thèmes relatifs à la scolarisation des filles, le mariage précoce, les problèmes de tuteur, les grossesses non désirées, la surexploitation des filles dans le commerce et les tâches ménagères, les avantages liés à la scolarisation des filles. Cette activité se fera dans dix-huit (18) collèges de chacune des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder ciblés par le Projet TFE. Chaque collège visité recevra un guide de sensibilisation reproduit à cet effet. La mission sera composée de deux</p>	Nbre de campagnes menées Nbre de parents touchés	DRES, COGES, DDES	30 250 000	60 500	DPSF/MES		X									
17	Octroi des bourses scolaires aux élèves filles des collèges	<p>Il s'agit d'octroyer des bourses à 1200 filles sélectionnées pour la période d'octobre, novembre et décembre 2016 à raison de 20000F CFA (par mois 15000 F CFA pour la famille d'accueil et 5000 F CFA pour la fille). Les bourses seront payées en novembre pour permettre aux filles de subvenir à leurs besoins et aux familles d'accueil de placer les filles dans des conditions de vie et d'études acceptables. Le montant total de la bourse pour cette période est de 215 820 000 F CFA. Un montant de 4 316 400 F CFA sera versé aux Institutions de micro-finances pour couvrir les frais bancaires et les coûts de distributions.</p>	Nombre de Bourses octroyées	ONGs	216 000 000	432 000	DPSF/MES	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

18	Appui a l'encadrement des eleves filles	De nombreux élèves viennent au collège avec des insuffisances particulièrement en français et en mathématiques. La compréhension du français conditionne celle des autres disciplines. Pour pallier ces insuffisances d'apprentissages, le projet TFE propose un encadrement des élèves des établissements bénéficiaires selon le processus suivant : 1. La DPSF en collaboration avec la DMP et le SPM de l'UGP procédera au lancement dans les journaux des appels d'offre pour recruter les ONG qui seront chargées d'encadrer les élèves (filles et garçons) en mathématiques et en français. Ces appels d'offre seront publiés dans les journaux ,2. La DPSF en collaboration avec la DMP et l'UGP procédera à la signature de contrats avec les ONG chargées de l'encadrement des élèves en mathématique et en français dans les établissements .Le cout de la publication (d'un montant de 559	Nbre d'établissements touchés	ONGs	23 659 533	47 319	DPSF/MES	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
----	---	---	-------------------------------	------	------------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

19	Accompagnement des filles bénéficiaires	<p>Pour accompagner les filles bénéficiaires, les partenaires de mise en œuvre en collaboration avec les COGES fourniront un appui continu et des séances d'échanges avec les filles bénéficiaires à travers des activités de coaching à raison d'une séance par semaine. La réalisation de cette activité se fera selon les étapes suivantes :</p> <p>1. La DPSF en collaboration avec la DMP et le SPM de l'UGP procédera au lancement dans les journaux des appels d'offre pour recruter les ONG qui seront chargées d'accompagner les filles boursières en coaching. Les appels d'offre seront publiés dans les journaux .</p> <p>2. La DPSF en collaboration avec la DMP et l'UGP procédera à la signature de contrats avec les ONG chargées de l'accompagnement en coaching des filles boursières dans les établissements pour un montant de 165 000 000 F CFA.</p>	nombre de filles accompagnées	ONGs	165 559 533	331 119	DPSF/MES	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
20	Formation des enseignants en approche genre, santé de la reproduction et Dividende Démographique	<p>charge des besoins spécifiques des élèves filles, les enseignants des établissements bénéficiaires de l'appui bourses aux élèves filles seront formés en approche genre et en santé de la reproduction. La formation permettra aux enseignants d'intégrer les notions relatives au thème dans leurs activités d'enseignement-apprentissages. Cette formation leur permettra d'adopter un changement de comportement vis-à-vis des filles et favoriser leur maintien au secondaire. Le support de la formation sera le module élaboré par la DPSF en approche genre et en santé de la reproduction qui sera validé à l'interne.</p> <p>Une formation de trois (3) jours pour les professeurs de chaque</p>	nombre d'enseignants formés	MPO; MSP, MPF/PE, MEP/T	14 054 000	28 108	DPSF/MES				X									

Sous-Projet "Toutes les Filles à l'Ecole" (Ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique (MEP/A/PLN/EC))																				
24	Identification des filles démunies et de celles désireuses de retourner à l'école (en collaboration avec le projet espaces surs)	Les filles démunies et celles désireuses de retourner à l'école seront identifiées par les DREP, DDEP, IEP et écoles ; cette activité est sans coût	Nbre de filles identifiées	DREP/DDEP, IEP	0	0	X													
25	Mener une campagne de sensibilisation de proximité au niveau des écoles cibles du primaire	Organisation des campagnes de sensibilisation de proximité qui mobiliseront les communautés à la base (APE, COGES, Elus locaux, associations religieuses, chefferie traditionnelle, leaders d'opinion, enseignants, administration scolaire, élèves, associations féminines) à travers des réunions et causeries – débats dans les établissements ciblés. La sensibilisation se fera autour des thèmes relatifs à la scolarisation des filles, la prévention des mariages précoces, la surexploitation des filles dans le	Campagne de sensibilisation menée Nbre d'inspections touchées Nbre d'écoles touchées	APE, AME, leaders religieux, chefs coutumiers et élus locaux/ONG/SWED D/DPSF	6 600 000	13 200	X													

31	Formation (enfants et Espaces Sûrs)	A.1.2. Recrutement des filles et femmes: la stratégie sera basée sur celle préconisée par le programme illimi avec les espaces sûrs; le processus de recrutement et les critères de sélection seront mis en œuvre avec la participation communautaire et les structures déconcentrées des deux ministères (MEPT et MPFPE) et vise à recruter 1500 en 2016 et 2017	Nb de femmes et filles recrutées	MEP/T, MPF/PE, MP, MJS, DRPFPE, DRFPT, DD ET SD	116 250 000	232 500	ONG	X	X	X	X	X						
Total A.1				127 880 520	255 761													
		A.2.1. Développement des programmes de formation: Elaborer des fiches d'identification des besoins en formation des filles et des femmes, Effectuer une mission de besoins en formation des femmes et filles et faire l'état des lieux des dispositifs existants dans les filières choisies dans les centres, Adapter les modules de formation en fonction des groupes cibles, Organiser le lancement de la formation des femmes et des filles, organiser des missions d'inspection de la formation	Nb de modules développés	MP, MJS, DRPFPE, DRFPT, DD ET SD, OSC, LEADERS D'OPINION, COMMUNAUTE	127 500 000	255 000	MEP/T MPF/PE	X	X	X	X	X						
		A2.2. Dotation en équipements et matières d'œuvres de 12 CFM et 8 CFPF pour 2016-2017: acquisition et acheminement des matériels.	Nb de CFM et CFPF dotés en équipements et matières d'œuvre	MPO	225 000 000	450 000	MEPF/T MPF/PE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

32

A2: Développement des qualifications professionnelles et entrepreneuriales chez les femmes et filles

<p>A.2.3 Renforcement de capacités des formateurs: organiser des ateliers régionaux de Formations transversales en informatique (Word, Excel et Power Point), entrepreneuriat et pédagogie, Formations professionnalisantes sur les nouvelles technologies en Couture et Agro-alimentaires, Formations professionnalisantes en Construction métallique, mécanique rurale (nouvelles techniques d'entretien et de réparation des moteurs à 2 temps et 4 temps), électricité bâtiment, agro-sylvo-pastoralisme des formateurs</p>	<p>Nb de formateurs formés</p>	<p>MPF/PE, MJS</p>	<p>342 774 000</p>	<p>685 548</p>	<p>MEP/T MPF/PE</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>									
<p>A 2.4 former les filles et les femmes en mécanique rurale</p>	<p>Nb de femmes et filles formées et dotées</p>	<p>MPF/PE, MJS</p>	<p>54 012 000</p>	<p>108 024</p>	<p>MEPF/T MPF/PE</p>				<p>X</p>											
<p>A2.5 former les filles et les femmes en électricité bâtiment</p>	<p>Nb de femmes et filles formées et dotées</p>	<p>MPF/PE, MJS</p>	<p>57 708 000</p>	<p>115 416</p>	<p>MEPF/T MPF/PE</p>				<p>X</p>											
<p>A2.7 former les filles et les femmes en EF (couture, broderie, teinture, Transformation agroalimentaire)</p>	<p>Nb de femmes et filles formées et dotées</p>	<p>MPF/PE, MJS</p>	<p>57 708 000</p>	<p>115 416</p>	<p>MEPF/T MPF/PE</p>				<p>X</p>											

		A2.8 former les filles et les femmes en Agro-sylvo-pastoralisme	Nb de femmes et filles formées et dotées	MPF/PE, MJS, MAG/EL	46 788 000	93 576	MEPF/T MPF/PE					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Total A.2			911 490 000	1 822 980															
33	A3: Insertion des filles formées dans le marché de travail	A.3.1 Doter les communautés des équipements d'allègement des tâches domestiques et de radios solaires	nombre de villages dotés	MP,MEP/T ; MJS	130 000 000	260 000	MEPF/T MPF/PE					X									
		A.3.2 Organiser les stages professionnel, le mentorat, l'apprentissage en partenariat avec le secteur privé	Nb de femmes et filles formées placées en stages	MP, MJS	70 000 000	140 000	MEPF/T MPF/PE	X	X	X											
		A.3.2. Doter les filles et les femmes formées en EF (couture, broderie, teinture,Transformation agroalimentaire) en kits d'installation	nombre de filles dotées	MPO, MEPF/T, MPF/PE	67 500 000	135 000	MPO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		A,3,3 Doter en kits d'installation les filles et les femmes Formées en mécanique rurale	Nb de femmes et filles formées et dotées	MPO, MEPF/T, MPF/PE	54 012 000	108 024	MPO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		A3.4 Doter des filles et des femmes Formées en electricité batiment	Nb de femmes et filles formées et dotées	MPO, MEPF/T, MPF/PE	57 708 000	115 416	MPO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

41	Organiser les dialogues communautaires	Elaboration du calendrier mensuel pour les dialogues communautaires, Faire le suivi de la mise en œuvre des dialogues communautaires	nombre de dialogues communautaires organisés	MJS/MSP/UNFPA/B M/ ONG	58 327 051	116 654	MPF/PE													X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Organiser les séances d'alphabétisation fonctionnelle	Recrutement des alphabétisateurs, Formation des alphabétiseurs, Faire le suivi des séances d'alphabétisation	nombre des séances d'alphabétisation organisées	MJS/MSP/UNFPA/B M/ ONG	221 237 044	442 474	MPF/PE													X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Organiser des activités physique et sportive	Définition des activités physiques et sportives, Equipement des adolescentes, Faire le suivi de la mise en œuvre des activités	nombre d'heures des activités physique et sportive dispensées	MPFPE/MSP/MES/ UNFPA/BM/ ONG	5 000 000	10 000	MJS													X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Organiser des activités socioéducatives	Définition des activités socioéducatives, Equipement des adolescentes, Faire le suivi de la mise en œuvre des activités socio éducatives	nombre d'heures des activités sociorecréatives dispensées	MPFPE/MSP/MES/ UNFPA/BM/ ONG	4 000 000	8 000	MJS													X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Evaluer et diffuser les résultats	Mise en place un dispositif de suivi et évaluation, Collecte et analyse les données, Faire le bilan, Diffusion des résultats	nombre de rapport produits et vulgarisés	MJS/MSP/UNFPA/B M/ ONG	5 000 000	10 000	MPF/PE													X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budget espaces surs					603 796 945	1 207 594																						
Clubs de futurs maris																												
46	Elaborer des modules des clubs de futurs maris	Faire les TDR pour l'élaboration des modules, Recrutement du consultant, Elaboration des modules, Validation des modules, Reproduction des modules	nombre des modules des clubs de futurs maris	MJS/MSP/UNFPA/B M/ ONG	15 000 000	30 000	MPF/PE	X	X	X																		

58	Mettre en œuvre les plans d'engagement	Il s'agit de mettre en œuvre les plans d'engagement	nombre de plans d'engagement mis en œuvre	UNFPA/BM/ ONG	20 286 324	40 573	MPF/PE					X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Produire et diffuser les émissions par les radios communautaires	Poursuite et approfondissement des discussions à l'issue des dialogues communautaires, Rappel des conclusions des dialogues en vue de toucher un large public à raison de d'une émission par semaine	nombre des émissions par les radios communautaires produites et diffusées	Radios communautaires, MPO, MCOM,	10 699 033	21 398	MPF/PE					X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Impliquer les chefs traditionnels et leaders religieux engagés sur la base d'un programme d'action annuel.	Elaboration d'un programme d'action annuel qui impliquera les chefs traditionnels et religieux engagés.	Chefs traditionnels et leaders religieux des communautés sont impliqués	UNFPA/BM/ ONG	11 092 239	22 184	MPF/PE					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budget communautés et leaders					57 260 843	114 522														
59	Organiser des visites à Domicile par les mentors et les guides	Pour suivi des reports et/ou renonclation aux mariages, Explication du programme aux parents, Discussion sur les connaissances acquises par les filles et faire le suivi des filles qui s'absentent ou qui sont régulièrement en retard, sensibilisation des maris et des adolescentes mariées sur les	nombre des visites à Domicile organisées par les mentors et les guides	UNFPA/BM/ ONG	23 107 328	46 215	MPF/PE					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Budget VAD					23 107 328	46 215														
Total couts FCFA					824 903 292	1 649 807														

12	Réaliser une étude coût/efficacité comparative des différents modèles de distribution entre le niveau CSI et Cases de Santé	Signature d'un contrat de prestations avec un cabinet conseil pour identifier le meilleur modèle de distribution entre le niveau CSI et les Cases de santé	Nombre de contrats signés Système de distribution entre le niveau CSI et les cases de santé	DPH/MT Programmes de santé	6 000 000	12 000	ONPPC	X	X	X										
13	Réaliser une phase pilote dans deux régions puis évaluer les résultats	Signature de contrat avec un cabinet conseil pour tester l'efficacité du modèle de distribution dans les deux régions	Nombre de contrats signés Phase pilote réalisée	DPH/MT Programmes de santé	74 762 069	149 524	ONPPC						X	X	X	X	X	X		
14	Mettre à l'échelle le nouveau modèle de distribution	Processus comportant plusieurs activités Objectif : Mettre à l'échelle le nouveau modèle de distribution	Nombre d'activités du processus menées	DPH/MT Programmes de santé	223 514 224	447 028	ONPPC													
15	Former le personnel à la méthodologie de quantification et de planification au niveau central	Organisation d'un atelier de formation	Nombre d'ateliers organisés Nombre de cadres formés	DRH/ONPPC	4 534 483	9 069	ONPPC						X	X	X					
16	Elaborer des procédures d'approvisionnement et de distribution en lien avec le modèle de distribution retenu	Organisation d'un atelier d'élaboration des procédures d'approvisionnement et de distribution en lien avec les modèles retenus	Nombre d'ateliers organisés Document de procédures défini	DPH/MT Programmes de santé	7 200 000	14 400	ONPPC						X	X	X					
17	Définir le cahier des charges (selon le document normatif national)	Signature d'un contrat de prestations avec un cabinet conseil pour définir le cahier des charges (selon le document normatif national)	Nombre de contrats signés cahier des charges défini (selon le document normatif national)	ONPPC/Programmes de santé /PTF	1 800 000	3 600	ONPPC						X	X	X					

47	Créer une commission technique chargée de l'harmonisation des documents et outils de formation des écoles de sages-femmes et assurer son fonctionnement		Nombre d'ateliers organisés Draft d'arrêté ministériel du MSP portant création et attributions de la commission	COPI, Directions Ecoles SF; UNFPA,BM	1 250 000	2 500	DRH	X	X	X										
48	Elaborer et harmoniser les outils de formation pour toutes les écoles publiques et privées /organiser un atelier de dissémination de ces outils au niveau des écoles publics/privés et de les adapter au niveau national	Organisation d'un atelier pour élaborer et harmoniser les documents et outils de formation des écoles publiques et privées de sages-femmes	Nombre d'atelier organisés Rapport d'atelier d'harmonisation des outils disponible	Commission harmonisation, Directions Ecoles SF UNFPA,BM	9 000 000	18 000	DRH	X	X	X	X	X	X							
49	Revisiter les profils et la représentativité des membres du jury au niveau des commissions régionales et nationale pour la formation des sage femmes selon les normes internationales	Organisation d'un atelier pour revisiter les profils et la représentativité des membres des jury nationaux et régionaux pour la formation de sages-femmes	Nombre d'atelier organisés Rapport d'harmonisation des profils des membres des jury disponible	DRH, COPI UNFPA,BM	3 500 000	7 000	DRH				X	X	X							
50	Former les membres des jury de la formation des sages femmes sur les compétences requises	Recrutement de 2 consultants (1 international et 1 National) pour organiser deux sessions de formation et d'orientation des membres du jury des 8 régions (notamment pour les membres du jury pratique) sur les compétences requises dans la formation soins sage femme	Nombre d'atelier organisés Rapport des deux ateliers de formation disponibles	DRH, COPI, Directions Ecoles SF UNFPA,BM	1 485 500	2 971	DRH	X	X	X										

67	Former les encadreurs de terrain de stage des soins sage femme sur la pédagogie de stage	8 ateliers de formation sur la pédagogie de stage	Rapports des ateliers de formation sur la pédagogie de stage Nombre d'encadreurs formés Liste nominative	Directions Ecoles SF, MIG, DRSP, CSME, Districts	5 000 000	10 000	DRH	X	X	X										X	X	X
68	Former deux enseignants par école de sages-femmes en capacités pédagogiques, soins obstétricaux et néonataux	Organisation d'une session de formation des enseignants sur les capacités pédagogiques, les SONU	Nombre de sessions de formations organisées Nombre d'enseignants	DRH, PTF, Directions Ecoles SF	2 000 000	4 000	DRH	X	X	X										X	X	X
69	Assurer la prise en charge des coûts d'une formation continue pour 80 encadreurs de sites de stages	Organiser des sessions de formation à l'endroit des encadreurs	Liste nominative des 80 encadreurs de sites de stages signée de la DRH - Attestations de fréquentation délivrées par les établissements d'accueil - Copie des transferts bancaires des frais	DRH, PTF, Directions Ecoles SF	131 000 000	262 000	DRH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Former 4 formateurs en Master II en SR	Assurer la formation de longue durée de 4 formateurs (Master II en SR)	Liste nominative des 4 formateurs signée de la DRH Copies des transferts bancaires des frais d'inscription et des bourses de subsistance des formateurs en	DRH, PTF, Directions Ecoles SF	4 880 000	9 760	DRH													X	X	X
Total Renforcement des capacités des ressources humaines					579 333 818	1 158 668																
Renforcement du plateau technique et des infrastructures des écoles de sages-femmes																						

Total Sous-composante 2.3					1 619 433 626	3 238 867													
Total Composante 2					4 178 130 969	8 356 262													
Composante 3 : Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du Projet																			
Sous composante 3.1: Renforcer le plaidoyer et l'engagement politique sur le dividende démographique aux niveaux national et régional																			
1	Finalisation des Policy Briefs sur le Dividende Démographique	Il est prévu la finalisation de 11 policy briefs : synthèse sur le Rapport DD, la dépendance économique, l'ouverture de la fenêtre démographique, les inégalités de genre, les disparités spatiales, jeunesse et marché du travail, la Gouvernance, la croissance inclusive, les transitions dans la pauvreté, les pôles économiques et les rendements de l'éducation . Un atelier de validation de 3 jours sera organisé	Nombre de policy brief validés	Equipe NTA, Ministères sectoriels SWEDD, UNFPA, BM	15 000 000	30 000	MPO			X	X			X	X				
2	Reproduction des Policy Briefs	Il est prévu la reproduction de 11 policy briefs : synthèse sur le Rapport DD, la dépendance économique, l'ouverture de la fenêtre démographique, les inégalités de genre, les disparités spatiales, jeunesse et marché du travail, la Gouvernance, la croissance inclusive, les transitions dans la pauvreté, les pôles économiques et les rendements de l'éducation. 2000 exemplaires sont prévus pour chacun des policy. <i>La prise en charge des honoraires</i>	Nombre d'exemplaires de policy brief reproduits	Ministères sectoriels SWEDD, UNFPA, BM	33 000 000	66 000	MPO							X				X	

24	Formation de 65 cadres centraux des Ministères Techniques Partenaires sur le Dividende Démographique	Cette activité permettra de renforcer les capacités 60 cadres centraux des ministères de la Population, de la Promotion de la Femme et Protection de l'Enfant, de la Santé, du Plan, des Finances, de la Jeunesse et Sports, de l'Education Primaire, des Enseignements Secondaires, des Enseignements Professionnels et Techniques, de l'Emploi et de la Renaissance Culturelle, Communication, Justice à travers un Atelier qui sera organisé à Niamey	Nbre de cadres formés	Ministères sectoriels partenaires de mise en œuvre	2 325 800	4 652	MPO (DSIC)				X							
----	--	--	-----------------------	--	-----------	-------	------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

25	Formation de 96 cadres régionaux des Ministères Techniques Partenaires sur le Dividende Démographique	Cette activité permettra de renforcer les capacités 96 cadres régionaux des ministères de la Population, de la Promotion de la Femme et Protection de l'Enfant, de la Santé, du Plan, des Finances, de la Jeunesse et Sports, de l' Education Primaire, des Enseignements Secondaires, des Enseignements Professionnels et Techniques, de l'Emploi et de la Renaissance Culturelle à travers deux Ateliers qui seront organisés à Zinder (48) et à Dosso (48)	Nbre de cadres formés	ministères techniques partenaires	17 805 280	35 611	MPO (DSIC)														
26	Organisation de 5 ateliers régionaux de formation sur le Dividende Démographique au profit des élus locaux	Cette activité permettra de renforcer les capacités de 238 élus locaux des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder à travers des formations "In situ" organisées par une équipe du MPO	Nbre d'élus formés	Maires des communes des 5 régions SWEDD/ Directions régionales MPO	53 808 232	107 616	MPO (DSIC)						X	X	X	X					

27	Formation de 100 journalistes des medias publics et privés, les radios communautaires ainsi que les structures de communication	Cette activité permettra d'améliorer le niveau de compréhension des journalistes des médias publique et privés et radios communautaires du concept du DD en vue de leur faciliter la communication	Nbre de journalistes formés	Responsables des médias publics set privés, radios communautaires et structures de communication	10 274 900	20 550			X	X							
28	Appuyer 238 Mairies des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder dont les maires ont été formés pour mener des activités de sensibilisation de proximité sur le DD à travers la communication pour un Changement Social et de Comportement (CCSC)	Il s'agit d'appuyer les 238 Mairies des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder dont les maires ont été formés afin qu'ils menent des activités de sensibilisation de proximité sur le DD à travers la communication pour un Changement Social et de Comportement (CCSC). Des contrats seront signés avec les prestataires à cet effet.	Nbre de contrats signés	Mairies des 238 communes/MPO (Directions régionales de la population)	47 600 000	95 200	Mairies					X					

44	Missions de supervision et d'inventaire des immobilisations	Organisation des missions de supervision et d'inventaire des immobilisations	Nbre de missions de supervision et d'inventaire des immobilisations organisées	UEP	6 000 000	12 000	MPO			X		X		X		X		X
45	Publication et annonces	Assurer les frais de Publication et annonces	Nbre d'avis et annonces publiés	UEP	12 000 000	24 000	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Audit comptable et financier (2015,2016)	Frais Audit comptable et financier (2015,2016)	Nbre d'audit comptable et financier	UEP	25 000 000	50 000	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Frais bancaires	Frais de tenue de comptes, agios pour le paiement des fournisseurs étrangers	Nbre de factures payées	UEP	800 000	1 600	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Redevances téléphone et internet	Frais de redevances téléphone et internet	Frais de redevances téléphone et	UEP	5 000 000	10 000	MPO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Logiciel de comptabilité	Achat de logiciel de comptabilité	Logiciel de comptabilité	UEP	25 000 000	50 000	MPO	X										
50	Matériels roulants	Achat de matériels roulants	Nbre de véhicules achetés	UEP	420 000 000	840 000	MPO	X										
51	Matériels informatiques, matériels de reprographie et outillages techniques divers	Achat de matériels informatiques, matériels de reprographie et outillages techniques divers	Nbre de matériels informatiques, matériels de reprographie et outillages	UEP	500 000 000	1 000 000	MPO					X						
52	Aquisition des outils de communication pour l'UEP (internet, flotte mobile y compris les appareils portables)	Achat des outils de communication pour l'UEP (internet, flotte mobile y compris les appareils portables)	Nbre d'outils de communication achetés	UEP	25 000 000	50 000	MPO		X									
53	Réalisation du logo du Projet	Réalisation du logo du Projet	Nbre de logo du Projet réalisé	UEP	2 000 000	4 000	MPO	X										

