

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union- Discipline- Travail

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE



RAPPORT FINAL

**Projet IYC/00/P01 : Appui au traitement et à
l'analyse du RGPH-98**

Mars 2004

SOMMAIRE

	PAGE
INTRODUCTION	3
I- RESUME DU PROJET	3
II- SUIVI DES RECOMMANDATIONS	4
III- ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET	4
3.1 RAPPEL DU PLAN DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2003	4
3.2 EXECUTION DES ACTIVITES	5
3.3 ETAT FINANCIER	7
3.4 CONTRIBUTION A L'ATTEINTE DES PRODUITS DU SOUS-PROGRAMME	7
3.5 FACTEURS FAVORABLES ET OBSTACLES LIES A L'EXECUTION DES ACTIVITES	8
3.6 CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES	9
3.7 APPUIS TECHNIQUES RECUS	10
3.8 DIMENSION GENRE	10
3.9 SUIVI-EVAULATION	10
3.10 PROPOSITION DE RECOMMANDATIONS	10
DEUXIEME PARTIE	11
TROISIEME PARTIE	15
CONCLUSION	15
ANNEXE	16

INTRODUCTION

Le RGPH-98, Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998, bénéficie, depuis son démarrage en octobre 1997, de l'appui financier, technique et matériel de l'UNFPA. Ce projet reçoit également des contributions en provenance d'autres partenaires au développement dont la Coopération française. Celle-ci a fait, dans le cadre d'un financement multi bilatéral, l'objet d'un accord de projet entre le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'UNFPA.

L'accord a été signé en août 1999 et la mise à la disposition des fonds est intervenue au cours de l'année 2000. Par cet accord, le projet bénéficie d'un appui de 100 millions de francs CFA sur les fonds multi Bi de la part de la Coopération française.

Conformément aux règles de suivi et évaluation des projets bénéficiant de l'appui de l'UNFPA, l'Institut National de la Statistique, organe national d'exécution, produit chaque année un rapport d'activité.

Le premier rapport annuel des activités a été produit en 2000, le deuxième rapport a été présenté en juin 2001. Le troisième rapport a été produit en mars 2002. Le quatrième rapport a été produit en février 2003. Le présent rapport est le rapport final du projet. Il comprend trois parties :

La première partie constitue le rapport annuel de l'année 2003 avec les différents chapitres classiques. La deuxième partie fait l'évaluation du projet et la troisième partie résume les enseignements tirés du projet.

PREMIERE PARTIE

Elle couvre les activités prévues et/ou réalisées en 2003. Elle présente le résumé du projet, le suivi des recommandations de la revue de la revue précédente, l'état d'avancement des travaux en mettant en relief la contribution aux produits du sous-programme stratégies en population et développement (SPD) ainsi que la contribution au renforcement des capacités nationales, les facteurs favorables et défavorables liés à l'exécution des travaux etc.

I. RESUME DU PROJET

Sous-programme	:	Stratégies en population et Développement (SPD)
Code du projet	:	IVC/99/P01
Titre du projet	:	Appui au traitement et à l'analyse des données du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGPH-98)
Localisation	:	Ministère de la Planification du Développement
Agences d'exécution	:	FNUAP
Organe de mise en œuvre	:	Institut National de la Statistique (INS)
Durée du projet	:	24 mois
Date de démarrage	:	Août 1999
Budget :		
- Contribution du FNUAP	:	100.000.000 FCFA
- Contribution du Gouvernement	:	1 992 000 000 FCFA

II. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE PRECEDENTE

La revue précédente a recommandé que des contacts soient pris avec les structures nationales pour qu'elles se joignent aux travaux de l'élaboration de l'atlas.

Les structures nationales compétentes ont été contactées. L'Institut de Géographie Tropicale (IGT) participe effectivement aux travaux techniques de l'atlas, dans le cadre du Comité Technique de Suivi mis en place après l'évaluation du projet par l'UNFPA. Un cartographe, enseignant chercheur assiste aux réunions du Comité. Celui apporte des avis sur les travaux et il corrige même d'autres.

III. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Cette partie du rapport fait un rappel du plan de travail de l'année 2003, analyse l'exécution des activités et l'état financier du projet, examine, entre autres, les points suivants :

- les contributions du projet i/ à l'atteinte des produits du sous-programme «stratégie en matière de population et développement» auquel il appartient dans le programme de coopération Côte d'Ivoire /FNUAP 1997-2001 et ii/ au renforcement des capacités nationales;
- les facteurs favorables et obstacles liés à l'exécution des activités ;
- les modes d'exécution et de réalisation des activités.

3.1 RAPPEL DU PLAN DE TRAVAIL 2003

L'année 2003 a été marquée par les effets de la guerre. Il y a eu une suspension des activités au regard des différents niveaux de sécurité. Puis à la reprise, une mission a été commise par l'UNFPA du 24 juillet au 6 août 2003 pour mesurer le travail accompli et les efforts déployés, évaluer les résultats obtenus et indiquer les efforts supplémentaires requis pour atteindre les meilleurs résultats au regard des objectifs du projet.

Au terme de cette mission, des recommandations ont été formulées assorties d'un plan de travail. Les recommandations sont :

- le renforcement des équipes actuelles de l'INS par le recrutement de consultants nationaux qualifiés pour encadrer efficacement les équipes de l'INS et exécuter là bien les activités d'élaboration de l'atlas et la production des cd-rom des résultats du RGPH-98 .
- l'acquisition de fournitures informatiques et la papeterie ;
- l'acquisition de quelques équipements pour le service des cartes numérisées ;
- l'impression des rapports du RGPH-98.
- la mise en place d'un mécanisme nouveau de suivi et d'évaluation des progrès réalisés ;
- la poursuite du financement des activités par l'UNFPA et la Coopération Française.

Le plan de travail assorti (voir annexe) prévoit à terme l'élaboration

- du cd rom inter actif du RGPH-98 ;
- du cd-rom vidéo du RGPH-98,
- des cd rom inter actifs de la consultation des résultats du RGPH-98,
- de l'atlas national et des atlas régionaux des résultats du RGPH-98 ;
- des cd rom inter actifs des atlas du RGPH-98 ;
- les impressions de rapports d'analyses ;
- l'organisation d'un séminaire de présentation des perspectives démographiques.

3.2 EXECUTION DES ACTIVITES

3.2.1 Activités complètement achevées

- Le comité technique de suivi et d'évaluation des progrès a été créé le 28 août 2003. Il comprend l'INS, le BUNAP, l'ENSEA, l'IGT et l'UNFPA. Il se réunit tous les 15 jours. Il a tenu huit réunions de suivi des activités au 22 décembre 2003. Une réunion bilan des activités a eu lieu le 7 janvier 2004.

- Les consultants nationaux ont été recrutés et ont travaillé depuis le 21 octobre au 31 décembre 2003. Il s'agit :

- * d'un démographe et d'un technicien statisticien en charge de l'élaboration des indicateurs démographiques pour l'atlas ;
- * d'un ingénieur informaticien et de deux techniciens informaticiens en charge de l'élaboration des cd-rom des résultats du RGPH-98 ;
- * d'un ingénieur informaticien et deux géomaticiens en charge de l'élaboration de l'atlas des résultats du RGPH-98 ;

Les contrats de ce personnel sauf celui de l'adjoint technique de la statistique sont prorogés jusqu'au 31 mars 2004.

- les équipements informatiques complémentaires ont été acquis et livrés à l'INS : il s'agit d'un micro-ordinateur, d'une imprimante, d'un disque dur, d'une barrette mémoire, d'une carte d'acquisition, de logiciels, de carte DVD.

- les fournitures informatiques et la papeterie demandées par l'INS lui ont également été livrées .

- Les indicateurs pour la confection de l'atlas national et des atlas régionaux sont disponibles aux niveaux géographiques requis : département, sous préfectures .

- L'édition des fiches monographiques sous fichier est désormais possible ;

- Les cd-rom inter actifs des résultats sont disponibles pour les thèmes : Fécondité, situation socio-économique des handicapés physiques, alphabétisation, instruction et fréquentation scolaire, activités économiques, mortalité, situation socio économique des personnes âgées, situation socio économique des enfants et des jeunes ; caractéristiques des ménages et condition de vie des populations; . L'équipe aura confectionné neuf cd-rom inter actifs .

- L'atlas national est disponible sur support papier
- Le cd rom de l'atlas national est également disponible
- Les 683 planches des atlas régionaux sont confectionnés.
- Le draft modèle de l'atlas régional (région des Lacs est validé et est disponible).
- Le film vidéo de la présentation introductive du Directeur Général est réalisé.

3.2.2 ACTIVITES NON EXECUTEES OU EN COURS D'EXECUTION

- *Impression des rapports de résultats* Le comité de suivi a accepté la proposition de l'UNFPA de surseoir à l'impression des rapports du RGPH-98 pour allouer prioritairement les ressources disponibles à la réalisation des cd-rom et des atlas. Les rapports concernés sont :
 - les deux tomes sur les indicateurs démographiques et sociaux par département en 1998
 - le tome sur la synthèse des principaux résultats du RGPH-98
 - le tome sur les perspectives démographiques nationales 1999-2018

est à
Il y a de préciser que l'option de l'impression de tous les tomes des rapports d'analyse des résultats du RGPH-98 par l'imprimerie de l'INS n'a pas produit tous les résultats attendus même si des moyens en papiers ont été dégagés par l'UNFPA. En conséquence 9 rapports sur 12 n'ont pu être imprimés à grande masse.

- *Confection des cd rom inter actif de sept autres d'analyse du RGPH-98* Il s'agit des thèmes suivants : 1- Etat matrimonial et nuptialité, 2- Mortalité, 3- Migration, 4- Situation socio économique des enfants et des jeunes, 5- Situation socio économique de la femme, 6- Situation socio économique des personnes âgées, 7- Caractéristiques des ménages et conditions de vie des populations.

- *Confection des atlas régionaux des résultats du RGPH-98.* Les planches des atlas régionaux ont été réalisées. Il reste à effectuer la spatialisation des indicateurs démographiques et à rédiger les notices.

- *Confection des cd rom des atlas .*

Les maquettes et les arborescences sont achevées. Il reste l'intégration des fichiers des cartes des 20 atlas et la rédaction des notices d'utilisation.

- *Confection du cd rom vidéo .*

La numérisation des films du RGPH-98 a été effectuée ; Il reste à reprendre le film de la présentation introductive du Directeur général de l'INS et à confectionner le Cd Rom.

3.3 Etat financier

L'exécution du budget se fait par le FNUAP. L'INS introduit les requêtes auprès du FNUAP qui les examine et exécute les dépenses selon les lignes budgétaires .

Pour l'année 2003, la répartition des allocations et des dépenses est dans le tableau suivant :

Ligne budgétaire	Allocation	Dépenses ⁽¹⁾	solde	taux d'utilisation

3.4 Contribution à l'atteinte des produits du programme

Le projet IVC/99/P01 (appui au traitement et à l'analyse des données du recensement Général de la population et de l'habitation de 1998) est une composante du sous programme "Stratégie en Population et Développement (SPD)". Les produits du sous programme sont : données actualisées en matière de population; connaissance plus approfondie des questions de population; déclaration de politique nationale de population opérationnelle; capacités institutionnelles et techniques améliorées pour les structures en charge de la promotion des femmes.

Les résultats obtenus dans ce projet au cours de cette année ont contribué à l'atteinte des produits suivants: données actualisées en matière de population; connaissance plus approfondie des questions de population. En effet, la réalisation de l'atlas national a révélé des informations sur les caractéristiques de la population sur le territoire qui n'étaient apparentes avec les indicateurs non cartographiés. Les cd roms et les atlas sont des produits nouveaux dans la diffusion des résultats de recensement sur la Côte d'Ivoire. La production des fiches monographiques sur support fichier participe de d'une plus grande aisance et d'une plus grande commodité de diffusion des résultats auprès de tous les utilisateurs.

3.5 Facteurs favorables et obstacles à l'exécution des activités

Au titre des facteurs favorables, on note les éléments suivants :

- La mission d'évaluation du projet commise par l'UNFPA. Les recommandations de cette mission ont été un catalyseur pour la relance des activités du projet ;
- Le recrutement du personnel contractuel a permis de connaître des avancées notables dans l'exécution des activités ;
- Les livraisons de nouveaux matériels , équipements et fournitures ont été bénéfiques au projet.

Au titre des facteurs défavorables, on note les éléments suivants :

- la situation socio politique du pays a mis en veilleuse pendant quelques mois l'exécution des activités ;
- la panne du rétro projecteur du projet a été un facteur bloquant pour l'organisation des séances d'adoption des productions des équipes.

- *l'appréciation de la charge du travail*: Le Comité de suivi a constaté que la charge de travail que constituaient la mise sur cd-rom des fichiers du RGPH-98, la confection des 20 atlas des résultats, l'édition sur fichier des fiches monographiques est trop importante à la pratique pour le temps imparti et l'environnement informatique du travail. Les objectifs de la période se sont avérés beaucoup pour les conditions mentionnées plus haut.

1) *l'environnement informatique de travail*: Les difficultés relatives à l'environnement informatique de travail proviennent du changement du cap dans le traitement de la conservation des résultats du RGPH-98 qui s'est imposé au BTPR. Au départ du projet, le BTPR a planifié de passer de l'archivage des résultats sur support papier utilisé au RGPH-1988 à l'archivage classique sur cd rom. A l'actif des résultats atteints, cet archivage a été réalisé. Les cd rom sous cette forme d'archivage sont disponibles aussi bien au siège que dans les directions régionales de l'INS.

La réalisation de cd rom sous la forme alternative dont il est question dans les activités en cours a été émise pendant des discussions portant sur la sauvegarde classique des résultats. Sans renoncer à la planification initiale et sans avoir pris correctement le contour de la question, le BTPR a été séduit par l'idée d'autant plus que les ressources du fonds multi bi de la coopération française pouvaient être allouées à cette production.

Lorsque le BTPR s'est mis à la tâche pour réaliser ces cd rom interactifs, il s'est très vite rendu compte des énormes difficultés que cela présentait à cause d'une part de la non conviabilité entre le logiciel IMPS utilisé pour produire les tableaux du RGPH-98 et le logiciel ACCESS qui devait servir à cette application et d'autre part du matériel informatique du RGPH-98 qui n'était pas acquis pour une telle production mais pour la saisie et l'exploitation des données de recensement.

La solution envisagée pour surmonter ces difficultés était d'abord de former des cadres de l'INS à la confection de cd rom interactif et ensuite d'acquérir du matériel adapté. Sur les fonds multi-bi, trois cadres de l'INS ont été formés en 2001. A ce jour, il ne reste qu'un seul, les deux autres étant partis de l'INS. Un micro ordinateur performant a été livré à l'INS en mai 2003, dix mois après sa commande. Avec ces contraintes, le BTPR a pu produire un seul cd rom interactif sur le thème ETAT ET STRUCTURE.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la mission commise par l'UNFPA dont l'INS met en œuvre les recommandations sous la bienveillance du 'un comité de suivi. Dans ce cadre, trois cadres informaticiens ont été recrutés pour renforcer le cadre informaticien de l'INS formé à la confection des cd rom. On se trouvait alors avec quatre cadres informaticiens devant une seule machine performante, celle acquise sur les fonds multi bi. Celle ci a pendant ces deux mois et demi d'activités servi à réaliser le cd rom interactif de référence du RGPH-98. avec le cadre de l'INS. Les trois personnes recrutées ne pouvaient travailler que sur les micro-ordinateurs Pentiums 2 ;64 M₀ en Ram, écran 15'' du RGPH-98 achetés pour le traitement informatique classique d'un recensement de population. Ils se sont évidemment avérés inadaptés aux conceptions et design en infographie et pour l'extraction des données de la base de données. Les travaux se sont déroulés après plusieurs gymnastiques et plusieurs arrêts des machines pour défaut de performance. Devant ces difficultés qui retardaient les travaux, l'INS a été amené à remplacer le 4 décembre 2003 les micro-ordinateurs du projet par des ordinateurs Pentium 4, achetés dans le cadre d'une autre activité. Cela a contribué à accélérer davantage le travail.

En définitive, le matériel informatique pour la réalisation des cd rom interactifs demandés est très insuffisant. Le matériel acquis dans le cadre du RGPH-98 est inapproprié car non destiné à la confection de cd rom interactif. La situation est un véritable plomb pour cette ambition.

- Le recrutement du personnel contractuel en suivant le processus normal a mis le temps qu'il fallait. La conséquence est que la durée de travail prévue a été empiétée. Au lieu de trois mois, le personnel contractuel a signé pour cela un contrat de deux mois et demi.

- Le recrutement de tout le personnel contractuel en même temps alors que les interventions des uns et des autres doivent se succéder. Cela a posé le problème de la quasi attente des uns pour disposer des éléments de travail que doivent leur fournir les autres. De telles difficultés ont retardé les travaux des atlas qui attendaient les indicateurs démographiques de l'équipe des démographes ; les travaux de la confection des cd-rom qui attendaient la fourniture des cartes par les géomaticiens. Là où cela a été plausible, c'est à la confection des cd-roms de l'atlas dont les travaux sont subordonnés à la disponibilité des atlas.

3.6. Contribution au renforcement des capacités nationales

Au terme des résultats atteints pendant la réalisation du recensement général de la population, les cadres nationaux ont accumulé une riche expérience dans le processus de traitement et d'analyse de la population et de l'habitation. Au cours de la période sous revue, les cadres de l'INS commis à la confection des cd rom ont confronté leurs expériences avec le personnel contractuel. Cela a été une occasion d'enrichissement mutuel.

2.7. Appuis techniques reçus

Au cours de la période sous revue, le projet a bénéficié d'un appui technique majeur. L'appui technique d'un consultant de l'UNFPA pour la relance des activités du projet à travers la mission d'évaluation et l'appui technique des contractuels recrutés pour l'élaboration des cd rom et des atlas.

Le consultant international par ces recommandations a remis en selle le processus d'exécution des activités du projet quasiment bloquées. Les contractuels, en se consacrant exclusivement à l'élaboration des cd rom et des atlas, ont permis au projet d'atteindre des résultats importants.

2.8. Dimension Genre

Un cd rom des résultats à réaliser, est consacré exclusivement à la situation socio économique de la femme.

3.9 Suivi et évaluation

Au cours de la période sous revue, le projet a fait l'objet de suivi et d'évaluation réguliers à travers les réunions du Comité de suivi des activités restantes du RGPH-98. La direction du projet a eu des contacts permanents avec l'UNFPA. A cela, il faut ajouter le traditionnel rapport d'activité établi à l'occasion de la revue annuelle du projet.

En ce qui concerne l'apport des contractuels, les travaux et les produits obtenus sont importants et novateurs. Pour la première fois, dans un recensement en Côte d'Ivoire, les résultats sont cartographiés sous forme d'un atlas sur support papier et sur cd rom. Les tableaux statistiques de la plupart des thèmes sont sur cd rom inter actif.

3.10 Propositions de recommandations

Les résultats obtenus malgré les difficultés évoquées, la connaissance exacte par le personnel recruté des tâches à exécuter pour achever les travaux amènent à faire les recommandations ci – après :

- La prorogation du contrat du personnel contractuel sauf celui de l'Adjoint Technique de la Statistique. La durée de prorogation du contrat serait de 3 mois à compter du 2 janvier 2004 ;
- Des dispositions pour imprimer les atlas dans une maison privée et pour dupliquer les cd-rom sur le marché soient par une maison privée.

Conclusion

La réalisation du RGPH-98 a constitué une innovation majeure dans le traitement des recensements de populations en Côte d'Ivoire. Plusieurs volets ont été concernés par les innovations, dont la publication et la diffusion des résultats. Sur ce plan, il a été retenu la cartographie des résultats sous forme de 20 atlas dont un national et dix neuf régionaux. Il faut également y ajouter la conservation des résultats sur cd rom classique et sur cd rom inter actif. La réalisation de ces innovations est fort heureusement soutenue par les partenaires au développement dont la France à travers les fonds multi bi. Cependant il convient de relever qu'aussi séduisantes qu'elles soient, certaines innovations ont été arrêtées pendant le déroulement du projet si bien que les moyens nécessaires à leurs réalisations n'ont pas été souvent disponibles parmi les moyens planifiés au départ du projet. C'est le cas des cd rom inter actifs et dans une moindre mesure des atlas. La sollicitude de l'UNFPA et de la coopération française a permis d'atteindre les résultats importants : 1 atlas national des résultats du RGPH-98 à valider, 683 planches des 19 atlas régionaux avec les données des localités, 5 cd rom inter actifs des résultats de 5 thèmes d'analyses des données du recensement, 1 cd rom inter actif de référence du RGPH-98. Il reste encore à finaliser l'atlas national, à intégrer aux planches des atlas régionaux les indicateurs démographiques, à réaliser les cd rom inter actifs des 20 atlas et les cd rom des 7 thèmes restants. . Cela est possible maintenant que le contours des tâches est bien connu et le projet a connu quelques renforcements au plan des ressources humaines et des moyens matériels. Tous les partenaires sont donc appelés à faire les derniers efforts nécessaires pour achever les activités.

Il y a lieu de remercier le personnel de l'UNFPA à Abidjan pour sa détermination et son soutien au BTPR à tout instant. Les remerciements vont à également M. Raphaël MFOULOU en poste actuellement à l'UNFPA au Niger pour son dévouement à la cause du recensement ivoirien et pour ses encouragements motivants aux cadres du BTPR. Que toutes les personnes morales et physiques non citées ici, qui ont, à un moment ou à un autre, apporté leur contribution au succès de ce projet sachent que le BTPR leur est reconnaissant.

A) DEUXIEME PARTIE

Le recensement général de la population et de l'habitation de 1988 avait, dans la phase de la cartographie, réalisé un recensement des localités. Ce dernier n'a pas été complètement effectué si bien qu'aucun résultat fiable n'a été établi. De même, l'utilisation des supports papiers de production des résultats s'étaient avérés incommode.

A la conception du RGPH-98, l'exploitation des données du Recensement des localités ~~était~~ apparaissait comme un défi à relever, ensuite, l'option d'archiver les résultats sur des supports moins encombrant avait été prise. C'est ainsi ^{avec} la disposition de la coopération française d'apporter un appui au RGPH-98, l'exploitation du fichier des localités, la diffusion des résultats sur des supports magnétiques et à travers l'atlas ont été planifiées dans le cadre du projet.

Quelle est alors la conception et la stratégie arrêtées pour traiter le problème ci-dessus mentionné.

La réalisation des fiches monographiques a obéit aux étapes classiques de l'exploitation des questionnaires remplis : codification des données, saisie, exploitation ; production des résultats. La stratégie a donné des résultats probants. Cependant, c'est dans la mise en œuvre liée aux disponibilités des moyens pour prendre en charge les ressources humaines que quelques difficultés vite maîtrisées, ont été observées.

Quant à la production des cd rom, la conception et la stratégie ont posé d'énormes problèmes. Ces difficultés sont liées aux déphases entre les moyens techniques disponibles et les travaux à faire. En effet, le seul micro ordinateur acquis pour les travaux étaient insuffisants et les autres micro disponibles étaient inappropriés. Le personnel n'était préparé aux travaux demandés.

Quant à l'atlas, les ressources humaines étaient insuffisantes pour sa réalisation.

Au terme du projet et des résultats obtenus, peut on dire que les objectifs assignés au projet ont ils ~~été~~ contribué aux résultats du programme pays ? On peut répondre par l'affirmative.

En effet, les résultats du projet contribuent à vulgariser les résultats du RGPH-98 sous une forme plus commode, plus accessible. Les fiches monographiques apportent des informations très appréciables sur les localités. Les supports disponibles les rendent utilisables à tout utilisateur. Les cd rom sont des véhicules des résultats à tous les niveaux. Les atlas donnent une représentation des résultats qui met en exergue des situations inédites.

Les résultats atteints sont à la hauteur des ressources fournies : Sur le plan matériel, le projet a permis à l'INS de disposer de deux micro ordinateurs qui ont servi à équiper le service de la cartographie numérique et le service de l'informatique.. Il y a également le matériel audio visuel qui est d'une grande utilité.

Sur le plan des ressources humaines, le projet a permis à l'INS de bénéficier également de l'appui technique de consultants de l'UNFPA, de la formation de cadres à des techniques nouvelles.(formation à l'élaboration de cd room inter actif).

RESSOURCES FINANCIERES

. Pour atteindre ces résultats le projet a bénéficié de l'apport financier des fonds multi bi à travers la Coopération française. Le niveau de financement est de 72 777 \$ en 2000 et de 71063 \$ en 2002 .

L'analyse des ressources et de l'exécution financière s'arrête malheureusement au 31 décembre 2001. Nous espérons compléter quand toutes les informations seront à notre disposition. Au 31 décembre 2001, l'exécution était de 54 762 \$ US

4.4: FINANCEMENT DE LA COOPERATION FRANCAISE

La première tranche de la contribution de la Coopération Française au RGPH-98 est de soixante douze mille sept cent soixante dix sept (72 777) US Dollars (USD) reparti comme suit :

- Personnel :	20 906
- Sous contrat :	16 845
- Equipement :	11 679
- Divers	17 889
- Administration :	5 458
Total :	72 777

Les fonds ont été alloués en 2000. L'exécution au 31 décembre 2001⁽¹⁾ chiffre à cinquante quatre mille sept cent soixante deux (54 762) usd réparti comme suit :

- Personnel :	19 450
- Sous contrat :	7 579
- Equipement :	11 679
- Divers	12 233
- Administration :	3 821
Total :	54 762

Soit un taux d'exécution de 59%.

Le solde budgétaire sur cette première tranche au 31 décembre 2001 est de dix huit mille quinze (18 015) usd réparti comme suit par rubrique budgétaire :

- Personnel :	1 456
- Sous contrat :	9 266
- Equipement :	0
- Divers	5 656
- Administration :	1 637
Total :	18 015

Comme pour l'analyse de l'exécution des autres financements, celle portant sur l'exécution au 31 décembre 2001 du financement de la Coopération Française se fera par rubrique budgétaire.

4.4.1 PERSONNEL

Le budget alloué est de vingt mille neuf cent six (20 906) usd répartis comme suit :

- Mission d'appui technique	11 842
- Personnel d'appui administratif :	0
- Voyages d'études, Per diems :	0
- Personnel de codification :	2 555
- Personnel de saisie :	1 709
- Personnel d'appui technique :	4 800
Total :	20 906

L'exécution au 31 décembre 2001 est de dix neuf mille quatre cent cinquante (19 450) usd et est répartie comme suit par ligne budgétaire :

- Mission d'appui technique	11 935	
- Personnel d'appui administratif :		0
- Voyages d'études, Per diems :		0
- Personnel de codification :		2 555
- Personnel de saisie :	1 709	
- Personnel d'appui technique :		3 251
Total :	19 450	

Le taux d'exécution est de 93%.

4.4.2 SOUS CONTRAT

Le budget prévu est de seize mille huit cent quarante cinq (16 845) usd destiné à la seule production de CD-ROM. Au 31 décembre 2001, ce budget a été exécuté à hauteur de sept mille cinq cent soixante dix neuf (7 579) usd , soit un taux d'exécution de 45%. Le solde à cette même date est de neuf mille deux cent soixante six (9 266) usd.

4.4.3 EQUIPEMENT

Le budget prévu est de onze mille six cent soixante dix neuf (11 679) usd réparti comme suit :

- Equipement fongible :	5 825
- Equipement audio-visuel :	5 854
Total :	11 845

Au 31 décembre 2001, le budget a été totalement exécuté . En effet, cette exécution s'élève à onze mille six cent soixante dix neuf (11 679) usd répartis comme suit :

- Equipement fongible :	5 825
- Equipement audio-visuel :	5 854
Total :	11 845

Soit un taux d'exécution de 100%.

Le solde est donc nul au 31 décembre 2001.

4.4.4 DIVERS

Le budget alloué se chiffre à dix sept mille huit cent quatre vingt neuf (17 889) usd et se répartit comme suit :

- Fonctionnement et entretien :	3 771
- Rapport et impression :	13 386
- Divers :	732
Total :	17 889

L'exécution au 31 décembre 2001 se chiffre à douze mille deux cent trente trois (12 233) usd et se présente comme suit :

- Fonctionnement et entretien :	3 771
- Rapport et impression :	8 462
- Divers :	0

Total : 12 233

Le taux d'exécution est de 69%.

Le solde au 31 décembre 2001 est de cinq mille six cent cinquante six (5 656) usd et se présente de la façon suivante :

- Fonctionnement et entretien :	0
- Rapport et impression :	4 924
- Divers :	732
Total :	5 656

4.4.5 ADMINISTRATION

Le budget alloué aux frais d'administration des fonds par le FNUAP a été estimé à cinq mille quatre cent cinquante huit (5 458) usd . Au 31 décembre 2001, ce budget a été exécuté à hauteur de trois mille huit cent vingt un (3 821) usd, soit une exécution de 70%. Le solde à cette même date est de mille six cent trente sept (1 637) usd.

RESSOURCES HUMANES

Les financements mentionnés plus haut ont permis l'utilisation d'importantes ressources humaines provenant tant du personnel permanent de l'INS mis sur le projet que du personnel contractuel. Le projet a mobilisé les responsables administratifs de l'INS , du Directeur général jusqu'aux chefs de services, chacun y a contribué à un moment ou à un autre. Il en est de même des cadres notamment tous les cadres démographiques et les agents du département de la démographie et des statistiques sociales. Le personnel contractuel est intervenu pendant les travaux de la codification et de la saisie ainsi que les travaux de confection des cd rom et des atlas. .

Toutes ces ressources humaines et financières ont permis d'atteindre les résultats obtenus. La principale observation est les conditions de mise à la disposition du projet des ressources de manière prompte qu'elles soient humaines ou financières. Les procédures des partenaires ont mis du temps pour être appliquées par la partie nationale. Cela explique que le projet ait trébuché en longueur .

Le projet a permis d'innover dans les acquis de ce recensement : les résultats sur les localités à travers les fiches monographiques . Cependant la situation de la guerre amène à envisager une actualisation des données compte tenu des conséquences de la guerre. I

D'où la nécessité de faire des recommandations pour garantir la durabilité des résultats obtenus. Cette recommandation consiste à l'organisation d'une grande opération d'actualisation des données des localités. Cette enquête permettra d'évaluer l'impact de la guerre sur les infrastructures socio économiques des localités et l'organisation sociale et économique des villages.

B) TROISIEME PARTIE

Le RGPH-98 a permis aux cadres d'acquérir beaucoup d'expérience. Il y a également des enseignements à tirer de cette expérience. Il sera retenus deux cas : La conception des activités, les rapports avec les partenaires.

La conception des activités doit le faire le tour de tous les moyens avant leur application. Les moyens mis en œuvre par le projet dépendent des planifications initiales. Tout changement doit s'accompagner des changements de moyens pour être exécutable avec aisance.

Les rapports avec les partenaires. Ces rapports sont basés sur les procédures de mise à disposition des moyens que les nationaux mettent du temps à comprendre et maîtriser. Les délais attachés à ces procédures sont parfois incompatibles avec la rapidité d'action. L'accession aux apports des partenaires devraient pouvoir être souple ou bien il convient, et cela est possible, d'imaginer un système de provision budgétaire de manière à donner un caractère d'appoint aux ressources des partenaires.

C) CONCLUSION

Les activités de l'année 2003 bouclent le déroulement de cet important projet. Au terme de ce projet, il faut se poser la question ^{de fait} si tous les objectifs assignés au projet à la conception ont été atteints et cela dans les délais requis ?

Les résultats atteints ne sont pas encore à la hauteur des ambitions ; Les délais de réalisation n'ont pas toujours été ceux indiqués par le calendrier de travail. Cependant les résultats atteints sont innovateurs et d'une grande utilité dans le programme de développement du Gouvernement.

Le projet a permis un équipement de l'INS et un renforcement des capacités. L'INS a innové et acquis une forte expérience dont certains INS s'inspirent en Afrique de l'Ouest (cas du NIGER qui a effectué un voyage d'étude à l'INS)

Pour conserver les résultats pour les actions de développement, il s'impose des ajustements eu égard aux conséquences de la guerre.

ANNEXES

- **Plan de travail de la période sous revue**
- **Etat financier de 2002 (se référer au fichier FinanceFNUAP2001.xls)**
- Personnel (tapez dans rapport 2000 page 27)
- Matériel (tapez dans rapport 2000 page 28)

ANNEXES

. Matériel

Article	Coût		Date de livraison		Observations
	Budget	Coût effectif	Calendrier	Date effective/ (est)	
1 APPAREIL AUDIO VISUEL				06-02-01	
MICRO ORDINATEUR				06-2002	
MICRO ORDINATEUR				13 10-2003	
IMPRIMANTE				22-10 2003	

Personnel

Contribution en personnel (Indiquer le titre, le nom, le sexe (M/F du titulaire)	D) <u>Plein temps ou</u> Temps partiel Date de recrutement	Observations
		Si les services du personnel de projet sont fourni retard par le gouvernement ou le FNUAP, précis raisons et dans quelle mesure ces retards entrave déroulement du projet

1. Administrateur fourni par le gouvernement (financé par le gouvernement)		
NEANT	NEANT	
2. Personnel d'appui recruté sur le plan national (financé par le FNUAP)		
- 2 INGENIEURS INFORMATIENS - 3 TECHNICIENS INFORMATIENS - 1 DEMOGRPHE - 1 TECHNICIEN STATISTICIEN	- PLEIN TEMPS	
3. Administrateurs recrutés sur le plan international (financés par le FNUAP)	- NEANT	
NEANT		

PLAN DE TRAVAIL

période d'exécution	activités	responsable
18-22/08/03	Mise en place du comité restreint ; 1 ^{ère} réunion de travail consacrée à l'examen et adoption des recommandations de la mission	INS/DG, UNFPA
18-22/08/03	Intervention du DG de l'INS sur cassette vidéo à graver sur CD-vidéo	INS/DG/DDSS
18-29/08/03	Rapport sur l'exécution du plan d'impression des rapports du RGPH-98	INS/DDSS
18-29/08/03	Elaboration des TDR du personnel d'appui à recruter	INS
18-29/08/03	Devis de traitement PAO des 3 rapports du RGPH-98	INS
25-29/08/03	Révision du budget du projet IVC/00/PO1	UNFPA
25-29/08/03	Etablissement des bons de commande pour l'acquisition des équipements et pour la gravure du CD-vidéo	UNFPA
01-05/09/03	Production du CD-vidéo	société privée
01-15/09/03	publication des avis de recrutement dans les journaux	INS, UNFPA
01-04/09/03	Devis de traitement PAO des 3 rapports du RGPH-98	INS/DDSS
01-15/09/03	consultation restreinte pour l'impression de 3 rapports du RGPH-98 auprès de 7 imprimeries de la place	INS, UNFPA
01/09- 31/10/03	Acquisition des équipements et des fournitures	sociétés privées
17-23/09/03	Analyse des dossiers de candidatures et pré-sélection des meilleures candidatures (constitution d'une liste restreinte)	INS, UNFPA
période d'exécution	activités	responsable
24-30/09/03	Test de sélection pour le recrutement du personnel requis	INS, UNFPA
29/09/03	Adoption des plans de travail pour l'élaboration de l'atlas det pour la réalisation des CD-rom des résultats du RGPH-98, proposés par les ingénieurs informaticiens recrutés	INS/DG/DDSS
29-30/09/03	Etablissement du bon de commande pour le traitement PAO des 3 rapports du RGPH-98	UNFPA
30/09/03	2 ^{ème} réunion ordinaire du comité restreint	INS/DG
01-15/10/03	Traitement PAO des 3 rapports du RGPH-98	société privée

01-15/10/03	recrutement du personnel d'appui pour une durée du contrat de 3 mois	INS, UNFPA
22-30/10/03	Etablissement des bons de commande pour l'impression des 3 rapports des résultats du RGPH-98	UNFPA
01/10-31/12/03	Exécution des travaux relatifs à l'élaboration de l'atlas et à la réalisation des CD-rom des résultats	INS/DDSS
20-30/10/03	Etablissement des bons de commande pour l'impression des rapports du RGPH-98	UNFPA
30/10/03	3 ^{ème} réunion du comité restreint	INS/DG
02-21/11/03	Impression des 3 rapports du RGPH-98	sociétés privées
27/11/03	4 ^{ème} réunion du comité restreint : bilan d'exécution du plan de travail du RGPH-98 et perspectives	INS /DG
18/11/03	Réunion spéciale du comité restreint sur l'examen du rapport d'exécution du plan d'impression des rapports du RGPH-98 su fonds du projet IVC/97/PO6	INS/DG
16-19/12/03	Séminaire de présentation des résultats des perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire :1998-2018 et lancement des produits du RGPH-98 déjà réalisés	INS/DG
22-31/12/03	Elaboration du rapport d'exécution du plan de travail du RGPH-98 relatif à l'élaboration de l'atlas et à la réalisation des CD-rom des résultats du RGPH-98	INS/DG
07/01/04	5 ^{ème} réunion du comité restreint : Bilan d'exécution du plan de travail relatif à l'élaboration de l'atlas et à la réalisation des CD-rom des résultats du RGPH-98	INS/DG


INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE



**RAPPORT DE CLOTURE DE
L'EXECUTION DES ACTIVITES
RESTANTES DU RGPH-98**

**Projet IVC/00/P01 : Appui au traitement et à
l'analyse du RGPH-98**

Août 2004

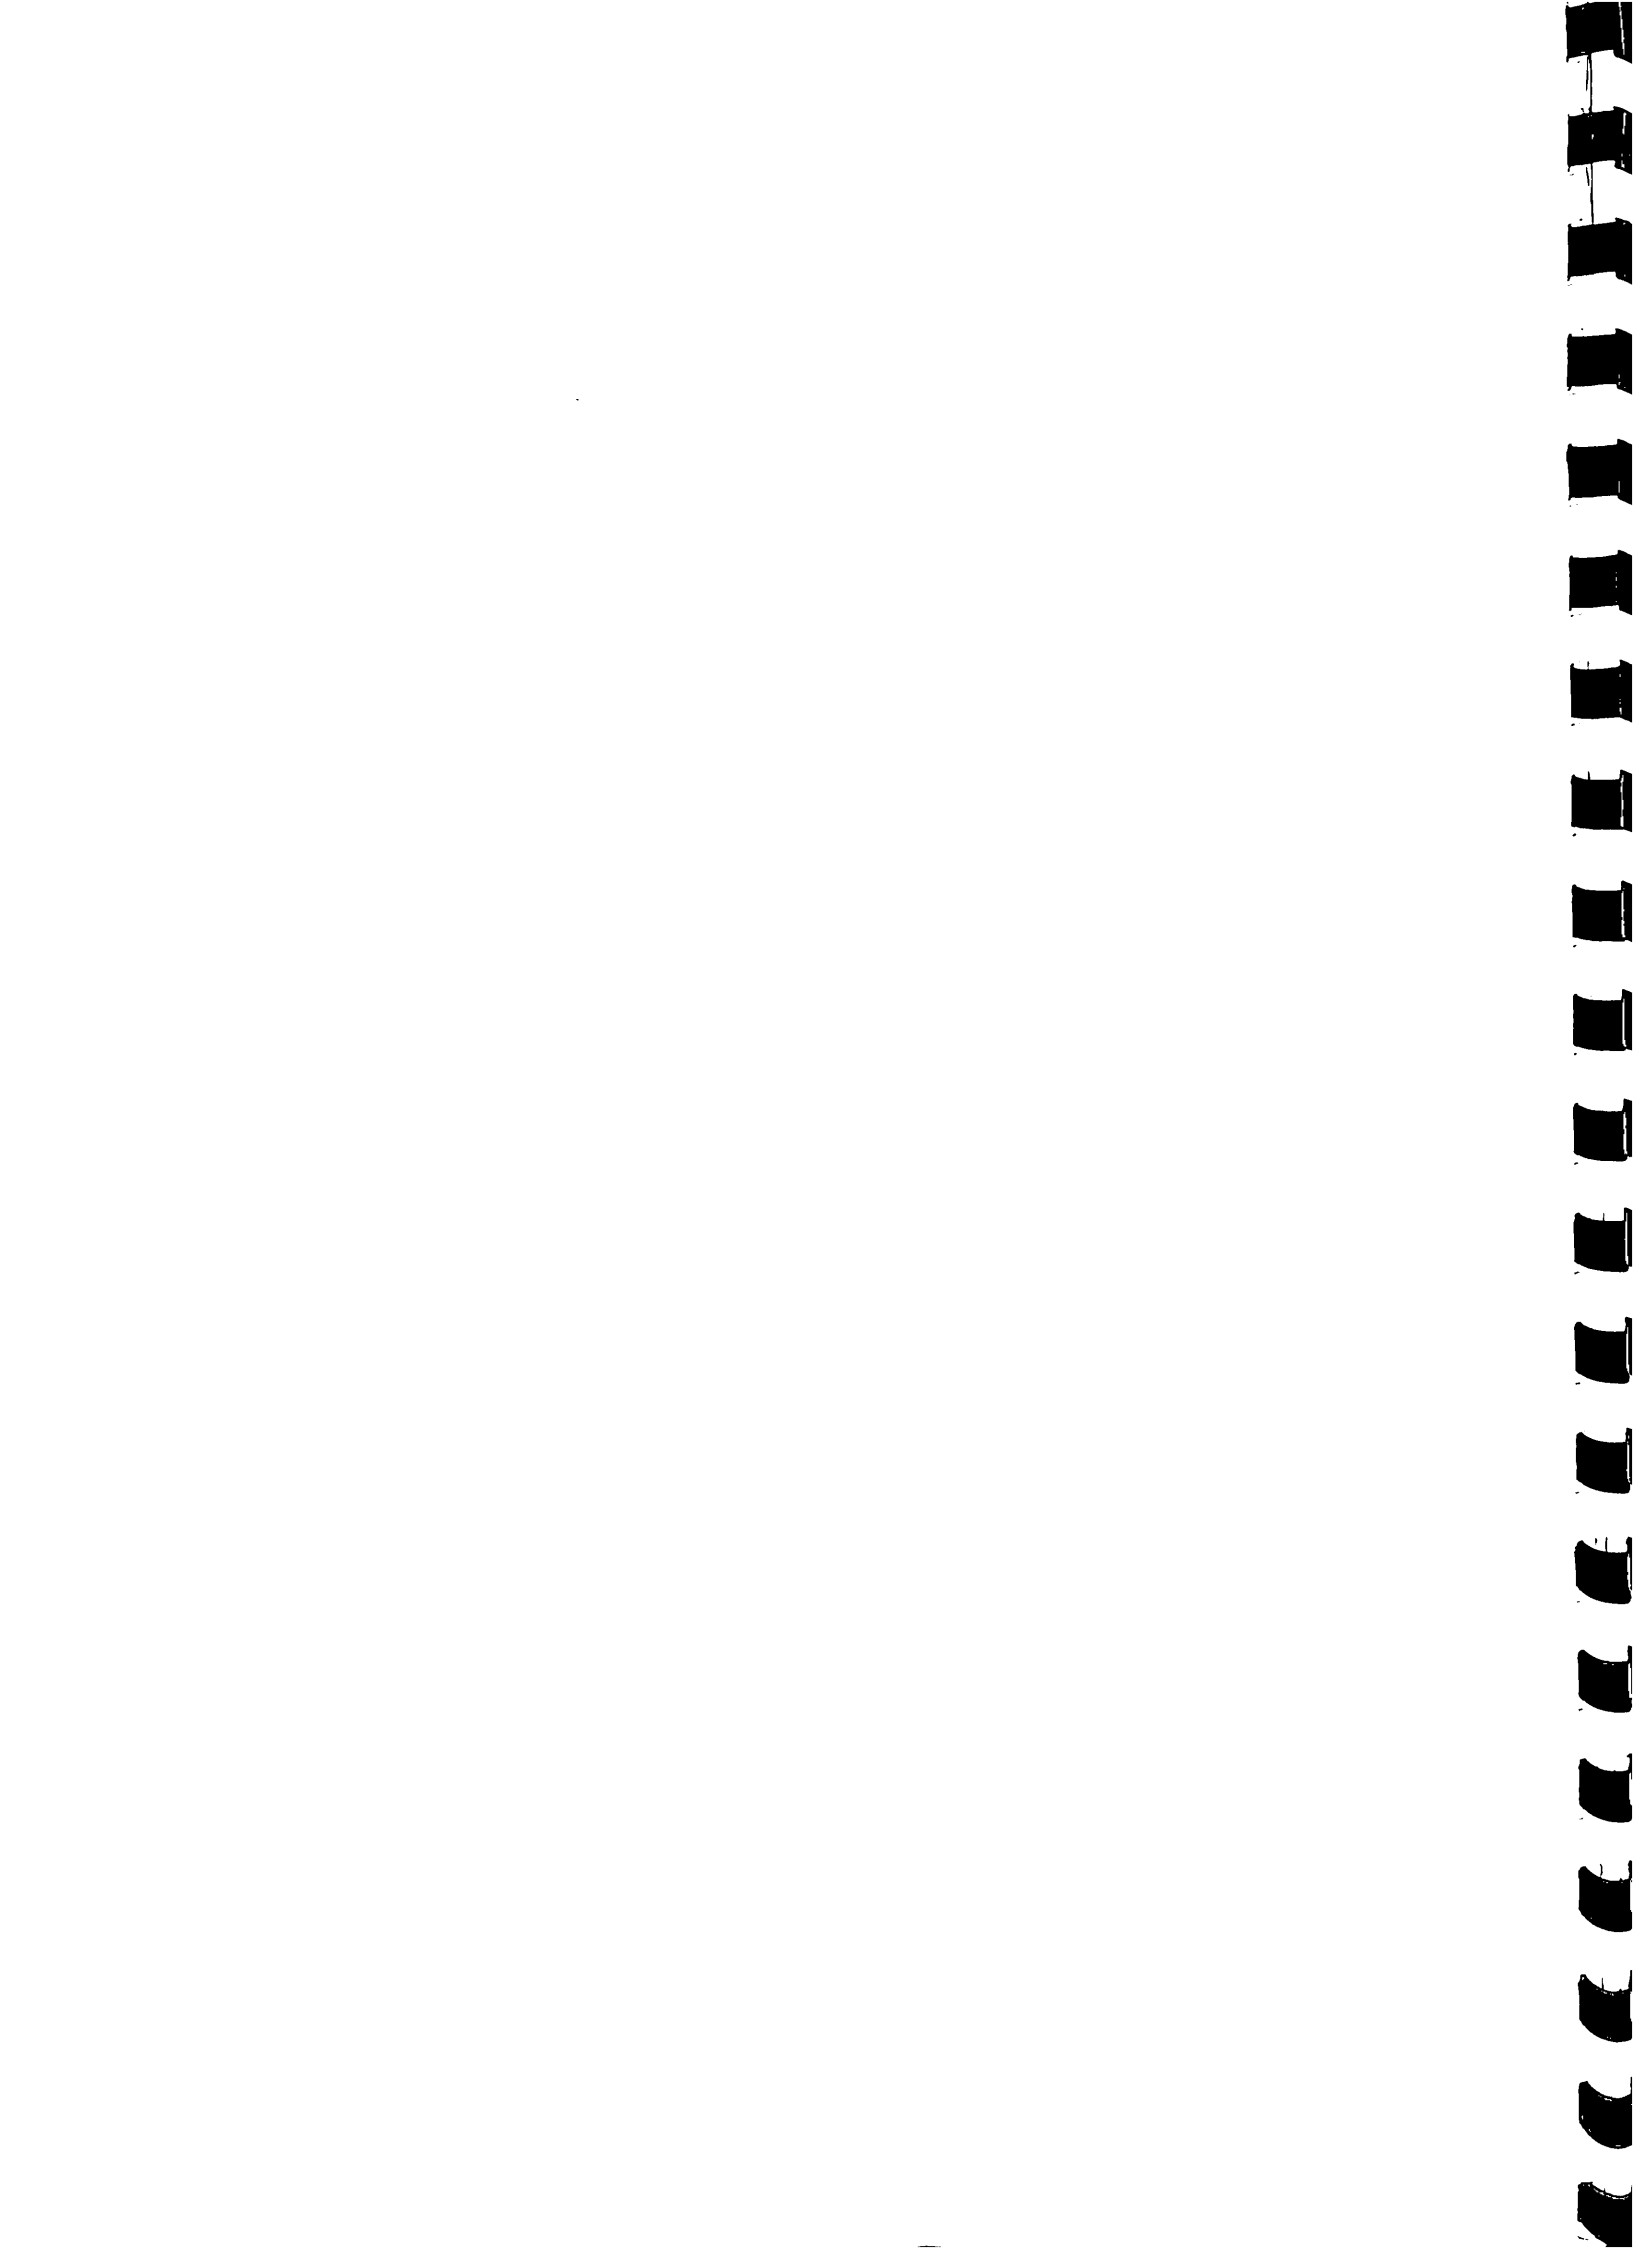

Introduction

Le projet RGPH-98 a reçu l'appui de la Coopération Française à travers les fonds multi Bi de l'UNFPA sous le projet IVC/00/P01 « Appui au traitement et à l'analyse des données du RGPH-98 » signé le 19 mai 1999. La mise en œuvre de ce projet a véritablement commencé en 2000. Elle devrait permettre de réaliser des activités novatrices pour un recensement de la population telles les fiches monographiques des localités de Côte d'Ivoire, le cd rom interactif des résultats du recensement, les cd rom interactifs de la gestion informatisée de la consultation des résultats définitifs, les atlas des résultats du recensement et les cd rom interactifs des atlas.

A la fin du deuxième trimestre 2003, les résultats attendus n'étaient pas tous entièrement réalisés. C'est alors que l'UNFPA a commis du 24 juillet au 6 août 2003 une mission d'appui technique de suivi du projet RGPH-98 pour mesurer le travail accompli et les efforts déployés, évaluer les résultats obtenus et indiquer les efforts supplémentaires requis pour atteindre les meilleurs résultats au regard des objectifs du projet.

Les recommandations de la mission ont été mises en œuvre à partir du 28 août 2003. L'exécution a déjà fait l'objet de deux rapports d'évaluation. Ce sont le rapport d'exécution des activités restantes au 31 décembre 2003 et le rapport d'exécution des activités restantes au 31 mars 2004.

En effet, A l'évaluation du 31 décembre 2003, les résultats atteints ont été particulièrement encourageants. Ils ont motivés toutes les parties à poursuivre l'effort sur la période du premier trimestre 2004 avec l'espoir de réaliser toutes les activités.

Au terme de cette période, bien que des avancées substantielles aient été observées, force est de reconnaître qu'il restait quelques dernières actions à mener pour boucler toutes les activités. Le financement multi bi étant arrivé à terme, l'Ins a pris la relève en prenant en charge les salaires des consultants du mois d'avril 2004 pour leur permettre d'avancer autant que faire ce peut dans l'achèvement des tâches restantes. Malgré cela, les résultats laissés par les consultants ont dû, sur la période de mai à juillet 2004, être peaufinés par les agents de l'INS pour être des produits présentables.

Ce rapport se veut le rapport de clôture de l'exécution des activités du Comité Technique de Suivi des activités restants du RGPH-98. Aussi a-t-il choisi de mettre l'accent sur les résultats obtenus en passant sur les péripéties de l'accomplissement des tâches exécutées. Le rapport rappelle donc les recommandations formulées par la mission de l'UNFPA et les résultats attendus d'elles. Ensuite il énonce les résultats atteints après la mise en œuvre de ces recommandations. Enfin il fait quelques recommandations.

1 – Les recommandations de la mission

La mission a recommandé :

- Le recrutement de consultants nationaux en vue de l'élaboration de l'atlas et de la production des cd-rom des résultats du RGPH-98 et de cd rom des atlas.
- l'acquisition de quelques équipements, de fournitures informatiques et la papeterie pour réaliser les activités ;



- l'impression des rapports du RGP H-98.
- la mise en place d'un mécanisme nouveau de suivi et d'évaluation des progrès réalisés ;
- la poursuite du financement des activités par l'UNFPA et la Coopération Française.

2 – Les résultats attendus

Les résultats attendus sont :

- un exemplaire de l'atlas national disponible
- 19 exemplaires d'atlas régionaux disponibles
- un cd rom master de l'atlas national disponible
- 19 cd rom master d'atlas régionaux disponibles
- un cd rom interactif master des résultats du RGP H-98 disponible
- 12 cd rom master de gestion informatisée de la consultation des résultats du RGP H-98 disponibles .
- 10 cd rom vidéo de présentation des résultats du RGP H-98 disponibles ;
- Sortie sur fichier des fiches monographiques opérationnelle
- l'impression des 3 tomes du volume V portant sur la situation démographique nationale.

3 – Les résultats atteints

Les résultats atteints sont :

- *La sortie sur fichier des fiches monographiques est opérationnelle*

L'édition des fiches monographiques des localités sur support fichier est effective. Un cd rom de la base des données d'édition des fiches monographiques sur support fichier est entièrement terminée et mise en exploitation.

- *Les atlas sur support papier*
- 2 exemplaires sur support papier de l'atlas national sont disponibles
- 38 exemplaires sur support papier des atlas régionaux sont disponibles à raison de deux exemplaires par région



- Les cd rom

Titre du cd	Cd rom master	Nombre de copies	Remis à l'UNFPA
Etat et structure	1	4	4
Migration	1	5	1
Fécondité	1	4	1
Mortalité	1	5	1
Alphabétisation, niveau d'instruction, fréquentation scolaire	1	4	1
Activités économiques	1	4	1
Situation socio économique de la femme	1	5	1
Situation socio économique des enfants et des jeunes	1	5	1
Situation socio économique des personnes âgées	1	5	1
Caractéristiques socio économiques des personnes handicapées physiques	1	4	1
Caractéristiques des ménages et conditions de vie des populations	1	5	1
Cd rom interactif des principaux résultats du RGPH-98	1	3	1
Cd rom atlas national	1	6	1
Cd rom atlas régionaux	19	76	1
Total	32	135	17


3- Les résultats non atteints

Il s'agit du cd rom vidéo de présentation des résultats. Le produit proposé par le fournisseur a été jugé de mauvaise qualité par l'expert de l'INS. Cela a été signifié au fournisseur qui s'est engagé à reprendre le travail. L'INS est attendue de la livraison.

Le cd rom de la gestion informatisée de la consultation des résultats du thème Etat matrimonial n'a pas été confectionné par faute de temps.

Il reste que les coffrets de protection de certains cd rom ne sont pas identifiées parce que les fournitures (étiquettes, papiers couchés) n'ont pas été livrées en quantité suffisante. Nous avons porté cela à la connaissance de l'UNFPA et nous avons attendu jusqu'à ce jour d'être approvisionnés.

l'impression des 3 tomes du volume V portant sur la situation démographique nationale n'a pas été effectuée. Les ressources disponibles s'avérant insuffisantes, le Comité de suivi a opté pour le report des impressions .

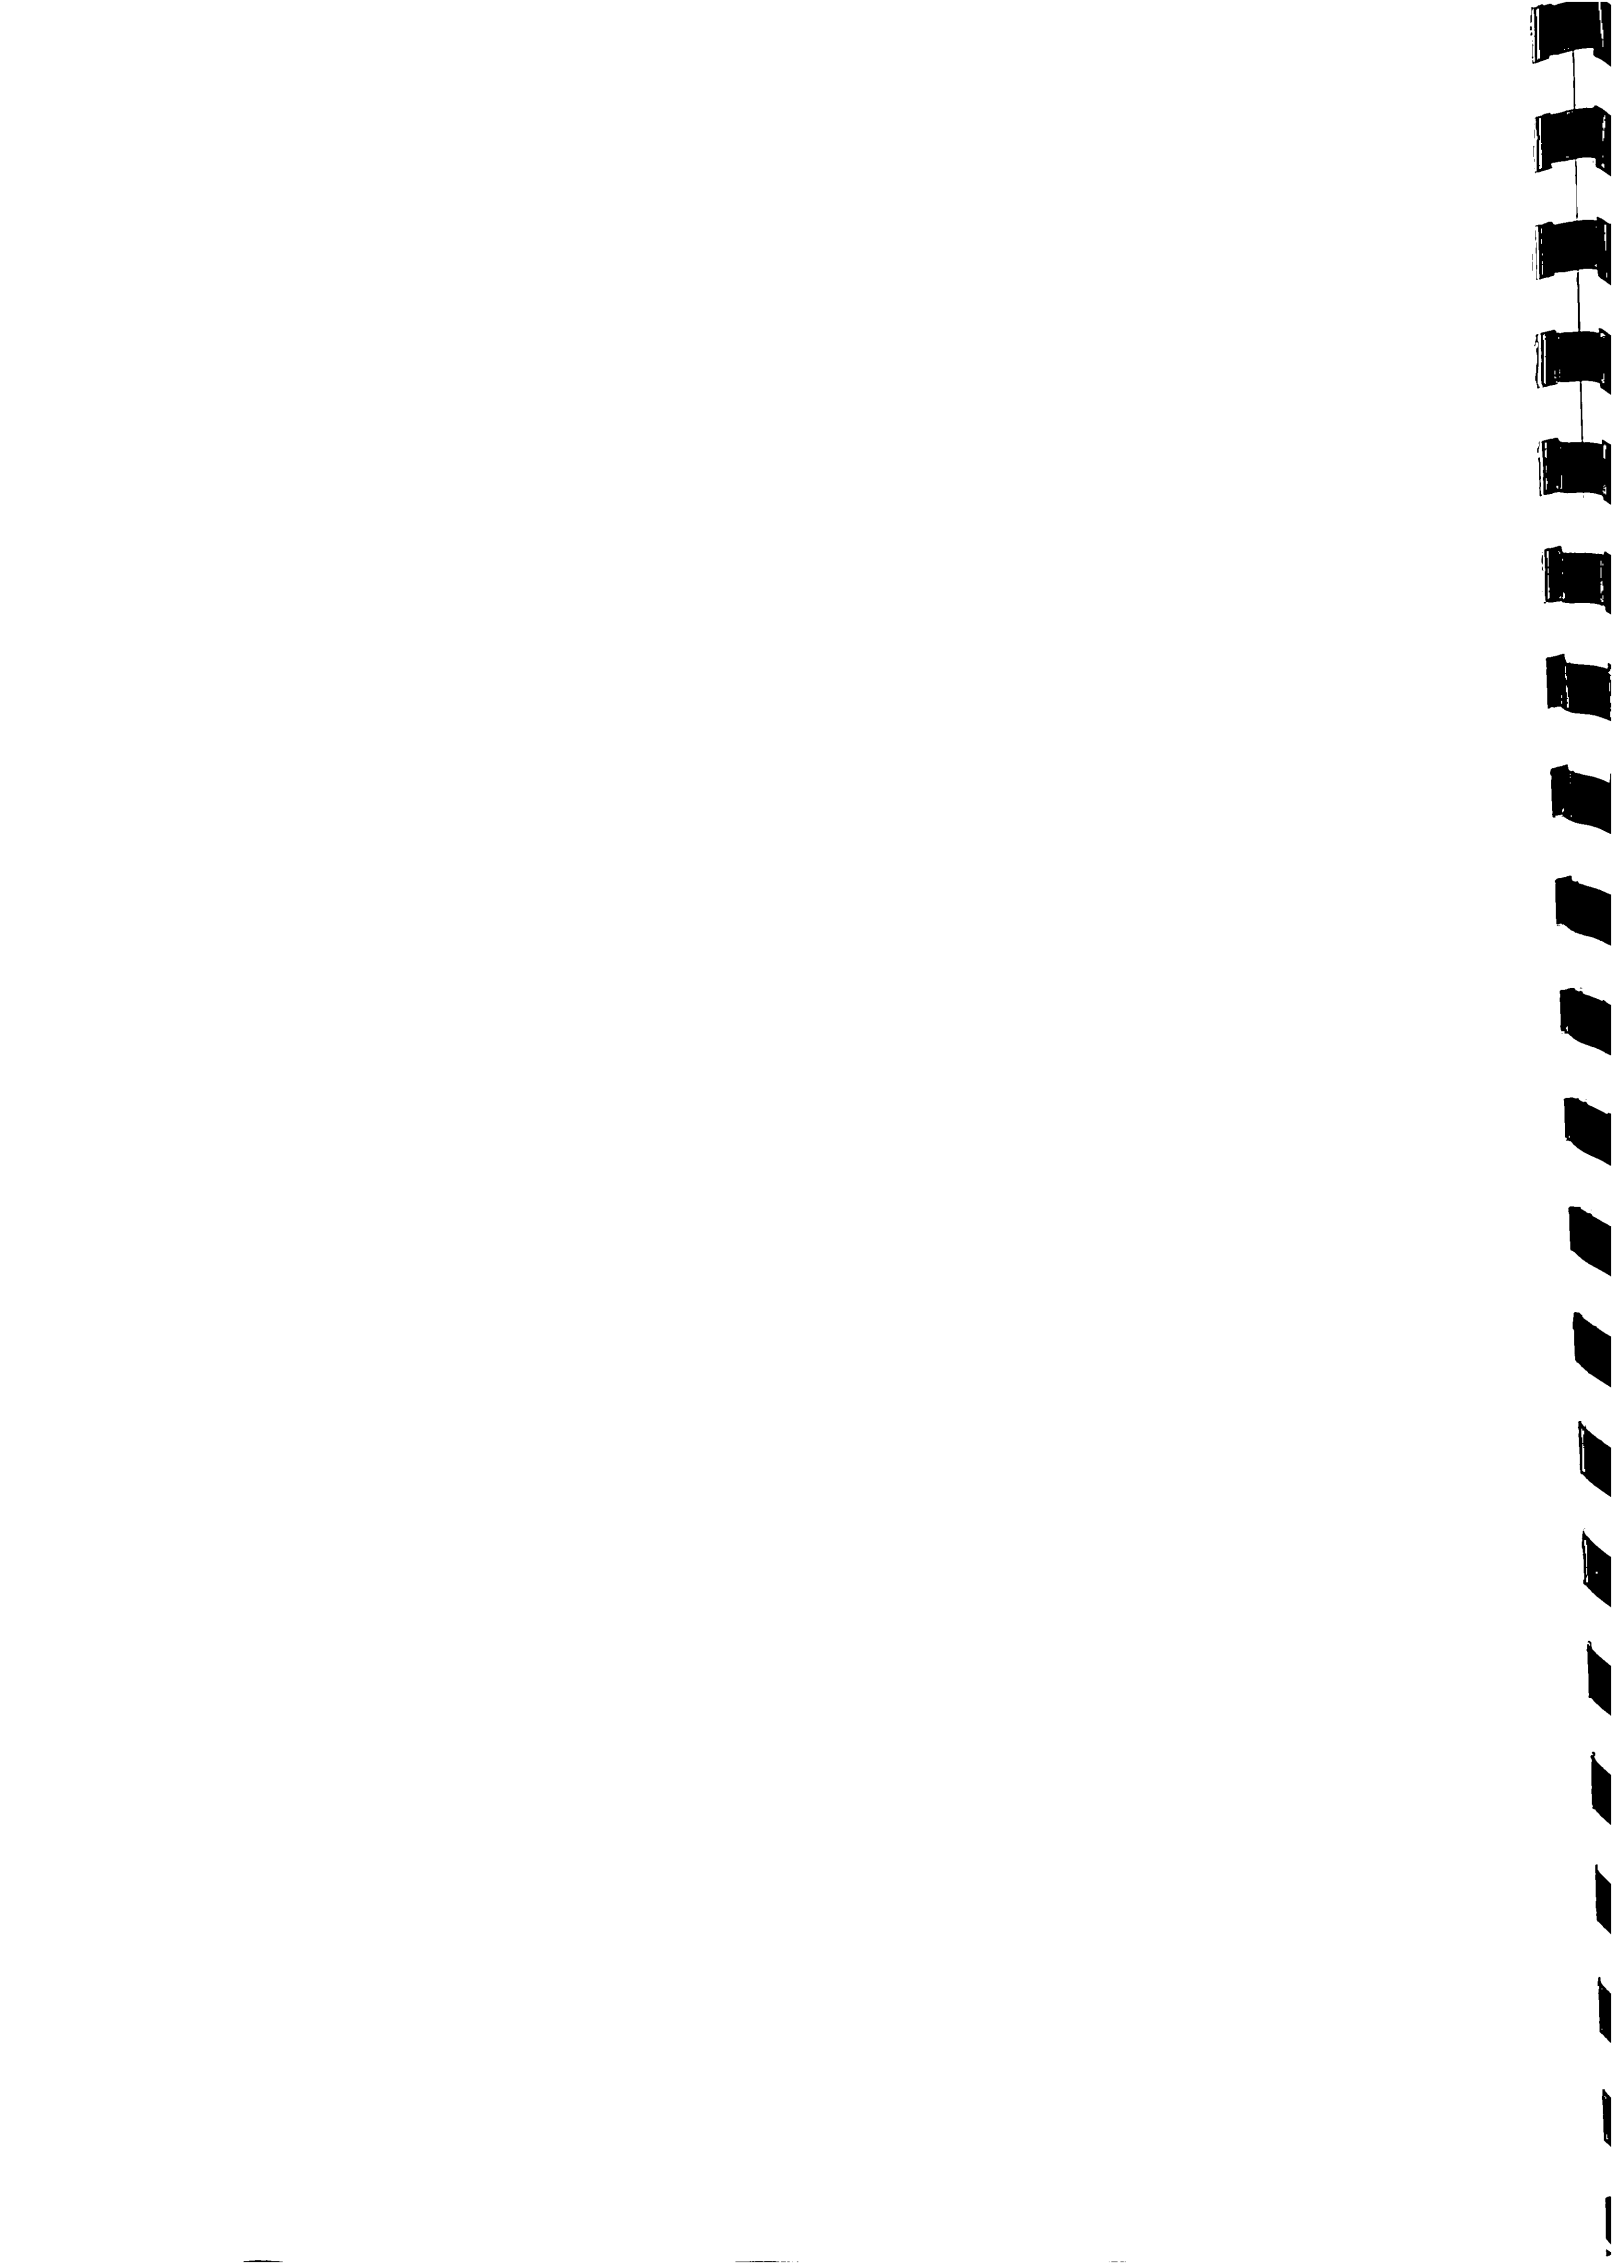

4- Les recommandations

Nous recommandons

1°) des actions concertées entre l'UNFPA et l'INS en vue d'amener le fournisseur du cd rom vidéo à livrer un bon produit . L'INS est disposé à poursuivre ces efforts à cet effet.

2°) Le plaidoyer pour la production en imprimerie des supports papiers des atlas et la reproduction en quantité importante des différents cd rom.

Conclusion

Le projet Multi Bi portant sur le RGPH-98 a expiré le 31 mars 2004. L'INS a pris la relève du paiement des salaires des contractuels pour le mois d'avril 2004. Puis il a poursuivi la finalisation des produits jus qu'au mois de juillet 2004.

Le projet Multi Bi portant sur le RGPH-98 a permis de réaliser des innovations majeures dans le traitement des recensements de populations en Côte d'Ivoire. Ainsi, grâce au projet Multi Bi, les résultats suivants ont été atteints :

- Elaboration des fiches monographiques des localités de la côte d'Ivoire
- Diffusion des fiches monographiques sur support papier et su support fichier
- Réalisation du cd rom interactif des résultats du RGPH-98
- Réalisation de cd rom interactifs de la gestion informatisée de la consultation des résultats définitifs du RGPH-98 portant sur 111 thèmes
- Réalisation de l'atlas national des résultats du RGPH-98
- Réalisation des atlas régionaux des résultats du RGPH-98
- Réalisation du cd rom interactif de l'atlas national ;
- Réalisation des cd rom des atlas régionaux des résultats du RGPH-98
- Acquisition de matériels (1 micro ordinateur et 2 imprimantes) et de logiciels informatiques ;
- Formation de cadres à la réalisation de cd rom interactifs

Ces résultats sont importants cependant il reste à les rendre accessibles aux utilisateurs d'où la recommandation forte relative à la reproduction des produits obtenus.

Le Chef du Projet

YAPO EUGENE

